INVESTICE POZEMKOVÉHO ÚŘADU

„Zatravněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k. ú. Pozďátky"

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

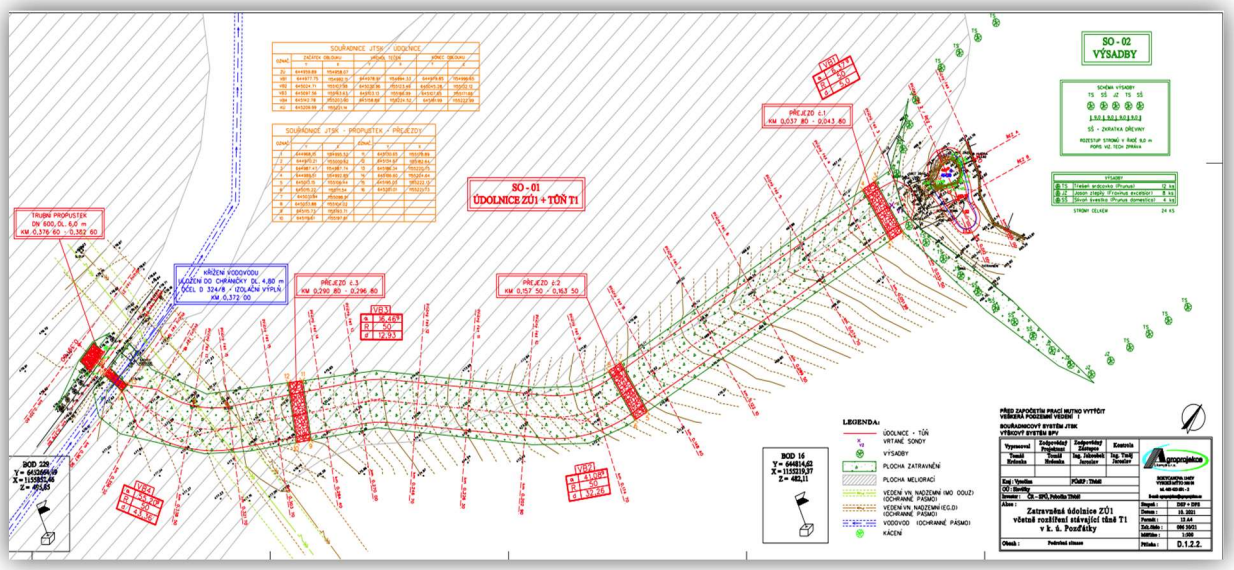

Stavba byla započata 27.3.2023 vytýčením, kácením určených dřevin a skrývkou ornice. Dále práce pokračovaly modelací údolnice a rozšířením tůně. Bylo zde provedeno zmírnění bočního svahu tůně, skácení spodní vrby a horní vrby byly ořezány.

Zhotovitel (Stavby rybníků, s.r.o.) provedl výstavbu propustku, modelaci údolnice a přejezdy údolnice. Následovaly práce jako položení a obetonování potrubí propustku a opevnění odtoku od propustku kamennou dlažbou, která byla vyspárována cementovou maltou.

Po dokončení betonovacích prací bude údolnice odplevelena a následně nově oseta. V neposlední řadě budou vysázeny dřeviny.

Veškeré práce by měly být dokončeny do konce října 2023.

Při této příležitosti se osloví místní truhlář, který by vyrobil k rybníku turistickou odpočívku (zastřešené posezení) a nové lavičky.
